
LOGO
EMPREENDIMENTO

Edificio Residencial Z - Modelo Cronograma Preliminar

LOGO
EMPRESA

Id	EDT	Nome da tarefa	% concluída	Início	Término
1	**1**	**Edifício Z1**	**60%**	**Seg 04/08/14**	**Ter 19/07/16**
2	1.1	Lançamento	100%	Seg 04/08/14	Seg 27/10/14
3	**1.2**	**Serviços Preliminares**	**100%**	**Seg 18/08/14**	**Qua 07/01/15**
4	1.2.1	Levantamento Planialtimétrico	100%	Seg 18/08/14	Seg 15/09/14
5	**1.2.2**	**Projeto**	**100%**	**Seg 01/09/14**	**Qua 07/01/15**
6	1.2.2.1	Civil	100%	Seg 01/09/14	Seg 24/11/14
7	1.2.2.2	Instalações	100%	Seg 29/09/14	Qua 07/01/15
8	1.2.3	Canteiro de obras	100%	Seg 15/09/14	Seg 13/10/14
9	1.2.4	Ligações Provisórias	100%	Ter 16/09/14	Ter 07/10/14
10	1.2.5	Proteção e Sinalização	100%	Ter 16/09/14	Ter 07/10/14
11	1.2.6	Locação de Obras	100%	Seg 22/09/14	Seg 06/10/14
12	1.2.7	Terraplenagem	100%	Seg 29/09/14	Seg 27/10/14
13	**1.3**	**Fundações**	**100%**	**Seg 20/10/14**	**Qui 19/02/15**
14	1.3.1	Movimentações de Terra	100%	Seg 20/10/14	Qua 11/02/15
15	1.3.2	Rebaixamento de lençol freático	100%	Seg 17/11/14	Qua 11/02/15
16	1.3.3	Estacas	100%	Seg 24/11/14	Qui 19/02/15
17	1.3.4	Blocos, Vigas e Cintas	100%	Seg 22/12/14	Qui 19/02/15
18	**1.4**	**Estruturas em Concreto**	**100%**	**Qui 19/02/15**	**Sex 18/09/15**
19	**1.4.1**	**Pilares**	**100%**	**Qui 19/02/15**	**Qua 27/05/15**
20	1.4.1.1	Ferragem	100%	Qui 19/02/15	Qui 12/03/15
21	1.4.1.2	Forma	100%	Qui 12/03/15	Sex 17/04/15
22	1.4.1.3	Concreto	100%	Sex 17/04/15	Ter 26/05/15
23	1.4.1.4	Escoramento	100%	Seg 20/04/15	Qua 27/05/15
24	**1.4.2**	**Vigas**	**100%**	**Seg 16/03/15**	**Ter 07/07/15**
25	1.4.2.1	Ferragem	100%	Seg 16/03/15	Ter 07/04/15
26	1.4.2.2	Forma	100%	Ter 07/04/15	Qui 14/05/15
27	1.4.2.3	Concreto	100%	Qui 14/05/15	Seg 06/07/15
28	1.4.2.4	Escoramento	100%	Sex 15/05/15	Ter 07/07/15
29	**1.4.3**	**Lajes**	**100%**	**Qui 09/04/15**	**Sex 31/07/15**
30	1.4.3.1	Ferragem	100%	Qui 09/04/15	Seg 04/05/15
31	1.4.3.2	Forma	100%	Seg 04/05/15	Qua 24/06/15
32	1.4.3.3	Concreto	100%	Qua 24/06/15	Qua 29/07/15
33	1.4.3.4	Escoramento	100%	Sex 26/06/15	Sex 31/07/15
34	**1.4.4**	**Escadas**	**100%**	**Qua 06/05/15**	**Ter 25/08/15**
35	1.4.4.1	Ferragem	100%	Qua 06/05/15	Qua 27/05/15
36	1.4.4.2	Forma	100%	Qua 27/05/15	Sex 17/07/15
37	1.4.4.3	Concreto	100%	Sex 17/07/15	Sex 21/08/15
38	1.4.4.4	Escoramento	100%	Ter 21/07/15	Ter 25/08/15
39	**1.4.5**	**Caixa Dágua**	**100%**	**Sex 29/05/15**	**Sex 18/09/15**
40	1.4.5.1	Ferragem	100%	Sex 29/05/15	Ter 07/07/15
41	1.4.5.2	Forma	100%	Ter 07/07/15	Ter 11/08/15
42	1.4.5.3	Concreto	100%	Ter 11/08/15	Qua 16/09/15
43	1.4.5.4	Escoramento	100%	Qui 13/08/15	Sex 18/09/15
44	**1.5**	**Alvenaria**	**100%**	**Qua 22/04/15**	**Qua 28/10/15**
45	1.5.1	Blocos Cerâmicos	100%	Qua 22/04/15	Qua 28/10/15
46	**1.6**	**Instalações**	**94%**	**Qui 21/05/15**	**Ter 23/02/16**
47	1.6.1	Elétricas	93%	Qui 21/05/15	Ter 23/02/16
48	1.6.2	Hidraulica e Incêndio	93%	Qui 21/05/15	Ter 23/02/16
49	1.6.3	Para Raios	100%	Qua 28/10/15	Seg 25/01/16
50	**1.7**	**Revestimento Interno**	**76%**	**Seg 31/08/15**	**Ter 03/05/16**
51	1.7.1	Chapisco	100%	Seg 31/08/15	Qui 24/12/15
52	1.7.2	Massa	100%	Qua 02/09/15	Ter 29/12/15
53	1.7.3	Azulejo	100%	Sex 04/09/15	Qui 31/12/15
54	1.7.4	Contra Piso	73%	Qua 02/12/15	Seg 29/02/16
55	1.7.5	Soleiras Filetes	70%	Sex 04/12/15	Qua 02/03/16
56	1.7.6	Cerâmica Piso	67%	Ter 08/12/15	Sex 04/03/16
57	1.7.7	Bancadas Granitos	0%	Qui 04/02/16	Ter 03/05/16
58	**1.8**	**Revestimento Exerno**	**41%**	**Qua 02/12/15**	**Qui 05/05/16**
59	1.8.1	Chapisco	44%	Qua 02/12/15	Qua 27/04/16
60	1.8.2	Massa	42%	Sex 04/12/15	Sex 29/04/16
61	1.8.3	Peitoris	40%	Ter 08/12/15	Ter 03/05/16
62	1.8.4	Textura	38%	Qui 10/12/15	Qui 05/05/16
63	**1.9**	**Gesso**	**30%**	**Seg 11/01/16**	**Qua 06/04/16**
64	1.9.1	Rebaixamento em Gesso	30%	Seg 11/01/16	Qua 06/04/16
65	**1.10**	**Esquadria Metálica**	**28%**	**Qua 09/12/15**	**Qui 05/05/16**
66	1.10.1	Esquadrias Ferro	98%	Qua 09/12/15	Sex 05/02/16
67	1.10.2	Esquadrias Aluminio	0%	Seg 08/02/16	Qui 05/05/16
68	1.10.3	Contramarco Aluminio	0%	Ter 08/03/16	Qui 05/05/16
69	**1.11**	**Esquadrias de Madeira**	**0%**	**Ter 08/03/16**	**Qui 05/05/16**
70	1.11.1	Portas Prontas	0%	Ter 08/03/16	Qui 05/05/16
71	**1.12**	**Impermeabilizações**	**43%**	**Qui 12/11/15**	**Seg 23/05/16**
72	1.12.1	Banheiros	48%	Qui 12/11/15	Qui 05/05/16
73	1.12.2	Varandas	47%	Seg 16/11/15	Seg 09/05/16
74	1.12.3	Lajes	45%	Qua 18/11/15	Qua 11/05/16
75	1.12.4	Telhados	43%	Sex 20/11/15	Sex 13/05/16
76	1.12.5	Caixa Dágua	42%	Ter 24/11/15	Ter 17/05/16
77	1.12.6	Piscina	40%	Qui 26/11/15	Qui 19/05/16
78	1.12.7	Jardineiras	38%	Seg 30/11/15	Seg 23/05/16
79	**1.13**	**Louças e Metais**	**0%**	**Qua 13/04/16**	**Qui 12/05/16**
80	1.13.1	Instalações	0%	Qua 13/04/16	Qui 12/05/16
81	**1.14**	**Telhados**	**0%**	**Ter 29/09/15**	**Qui 10/12/15**
82	1.14.1	Madeiramento	0%	Ter 29/09/15	Qui 26/11/15
83	1.14.2	Telhas e Rufos	0%	Qua 14/10/15	Qui 10/12/15
84	**1.15**	**Vidros**	**0%**	**Qui 31/12/15**	**Seg 29/02/16**
85	1.15.1	Vidros temperados	0%	Qui 31/12/15	Seg 29/02/16
86	1.15.2	Vidros espelhados	0%	Qui 31/12/15	Seg 29/02/16
87	**1.16**	**Pintura**	**0%**	**Seg 29/02/16**	**Qui 23/06/16**
88	1.16.1	Massa Pva	0%	Seg 29/02/16	Qua 25/05/16
89	1.16.2	Pintura Interna	0%	Ter 29/03/16	Qui 23/06/16
90	**1.17**	**Elevadores**	**0%**	**Qui 24/12/15**	**Ter 22/03/16**
91	1.17.1	Instalação	0%	Qui 24/12/15	Ter 22/03/16
92	**1.18**	**Paisagismo**	**0%**	**Sex 08/04/16**	**Qui 09/06/16**
93	1.18.1	Colocação de Plantas	0%	Sex 08/04/16	Ter 07/06/16
94	1.18.2	Grama	0%	Ter 12/04/16	Qui 09/06/16
95	**1.19**	**Portaria**	**0%**	**Ter 08/03/16**	**Seg 16/05/16**
96	1.19.1	Piso em granito	0%	Ter 08/03/16	Qui 05/05/16
97	1.19.2	Decoração	0%	Qui 10/03/16	Seg 09/05/16
98	1.19.3	Balcão	0%	Qui 17/03/16	Seg 16/05/16
99	**1.20**	**Passeio**	**0%**	**Seg 25/04/16**	**Ter 21/06/16**
100	1.20.1	Calçadas	0%	Seg 25/04/16	Ter 21/06/16
101	**1.21**	**Limpeza**	**0%**	**Ter 21/06/16**	**Ter 19/07/16**
102	1.21.1	Limpeza da Obra	0%	Ter 21/06/16	Ter 19/07/16

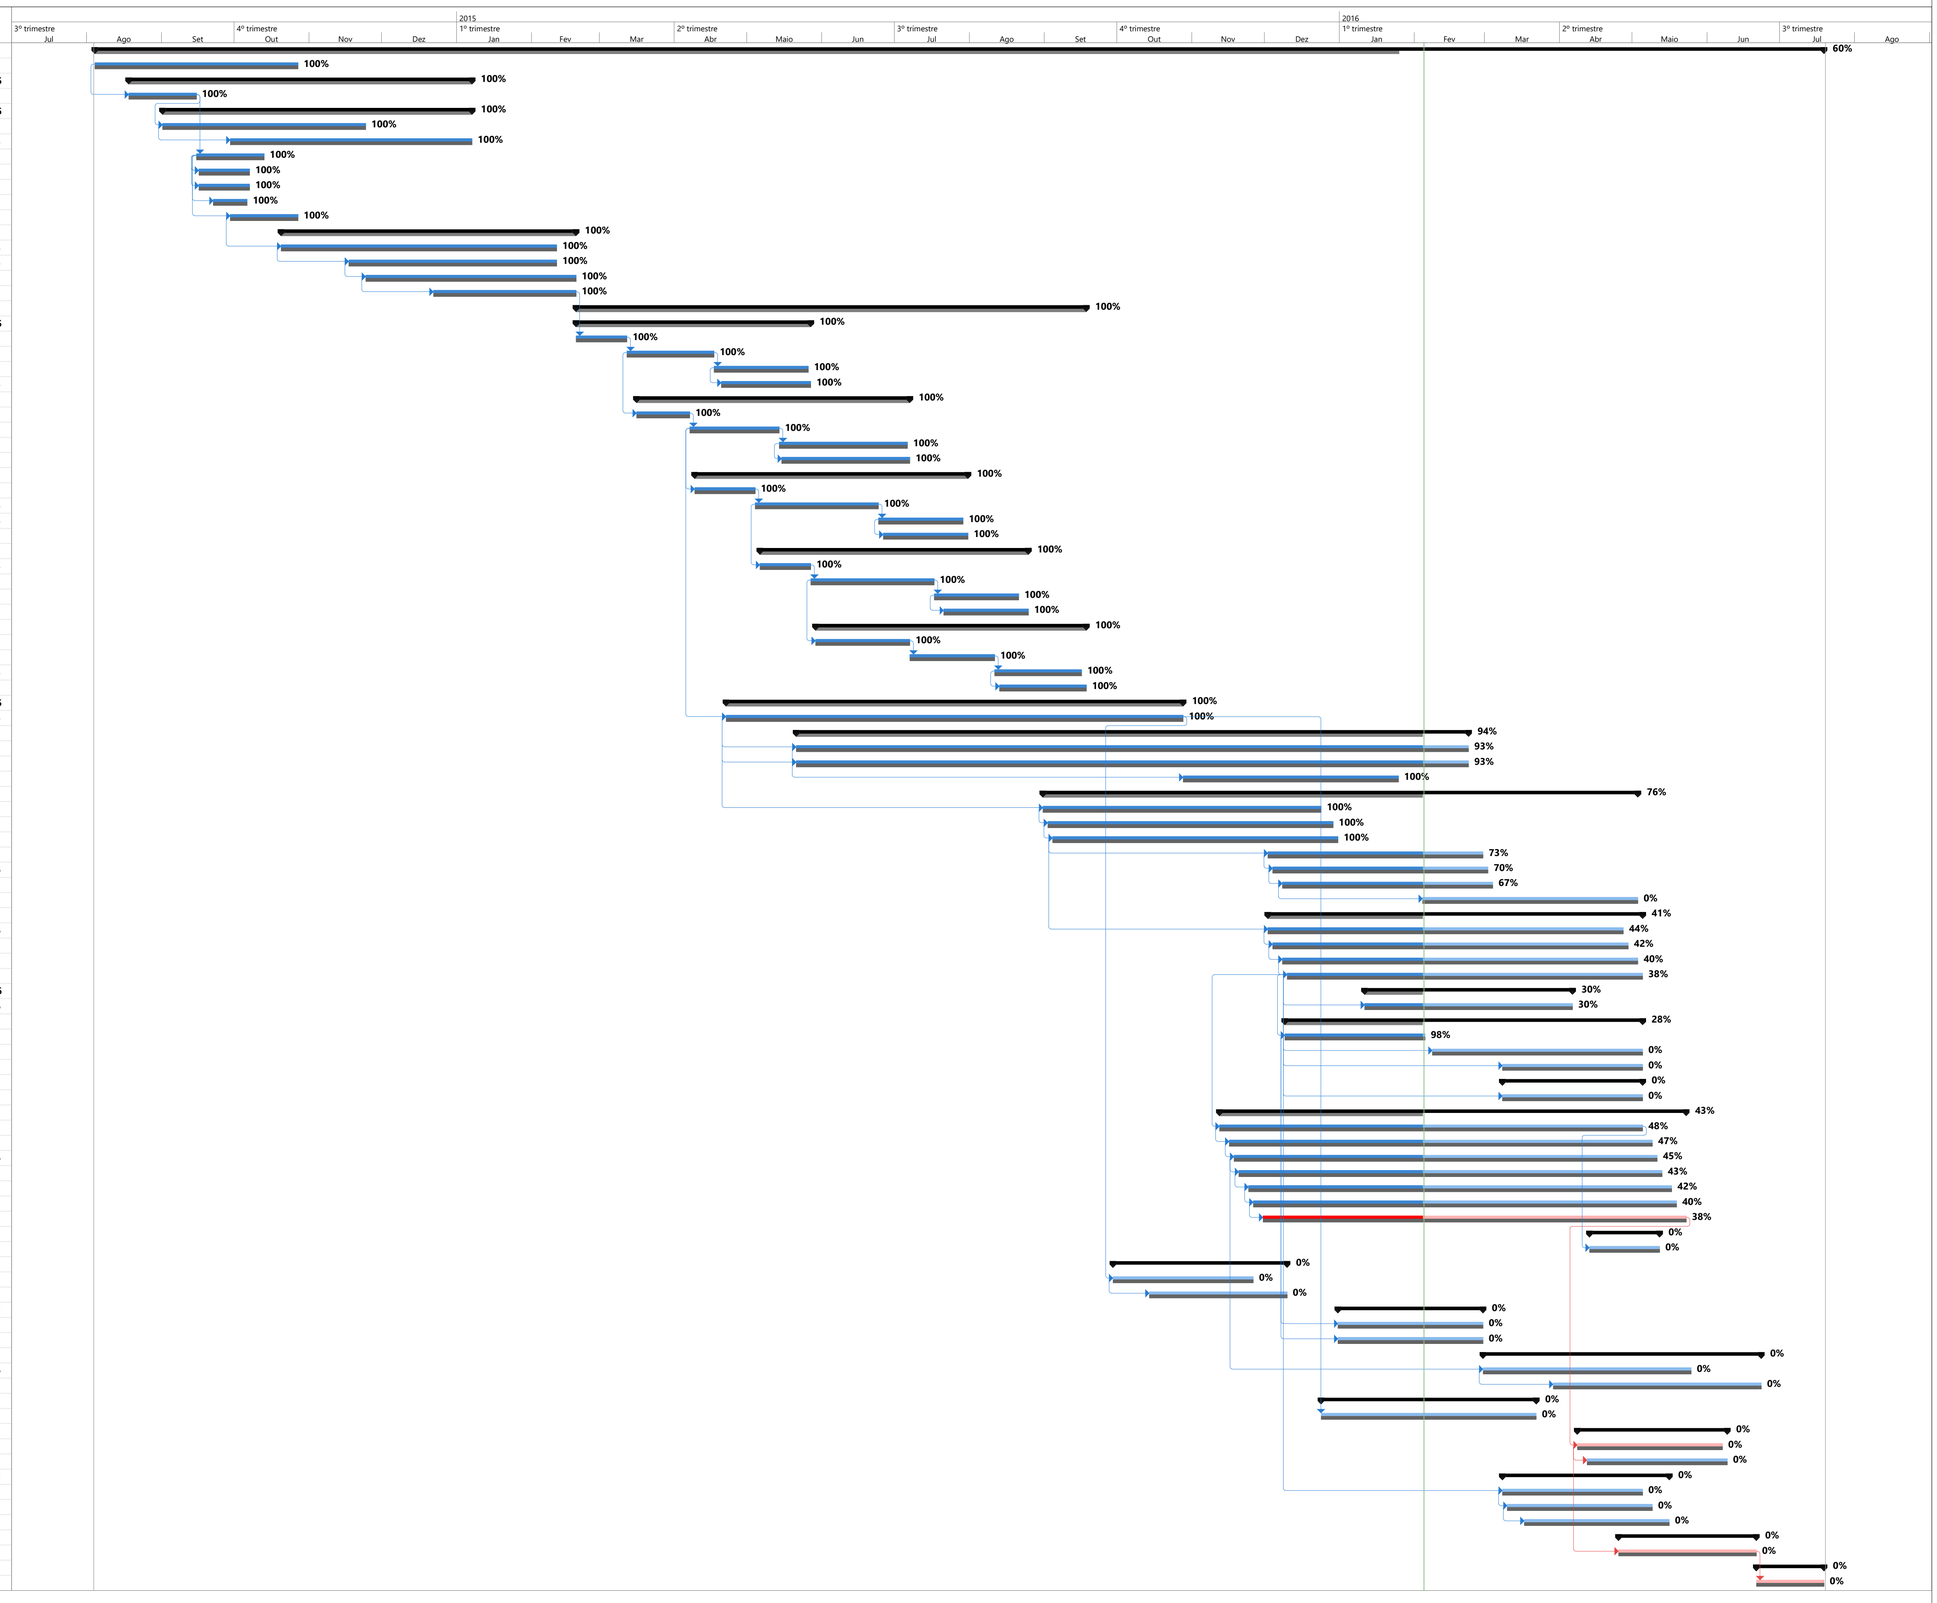

Projeto: Edificio Residencial Z - Modelo Cronograma Preliminar
Data: Sex 05/02/16
Elaborado por: Luciana Freitas - Website: www.lfplan.com

Crítica, Divisão Crítica, Andamento Crítico, Tarefa, Divisão, Andamento da Tarefa, Tarefa Manual, Somente início, Somente término, Somente duração, Linha de Base, Divisão da Linha de Base, Marco de Linha de Base, Marco, Andamento do Resumo, Resumo, Resumo Manual, Resumo do projeto, Tarefas externas, Marco externo, Tarefa Inativa, Marco Inativo, Resumo Inativo, Data limite
